


Travaux CPER

18 septembre 2012

Planning

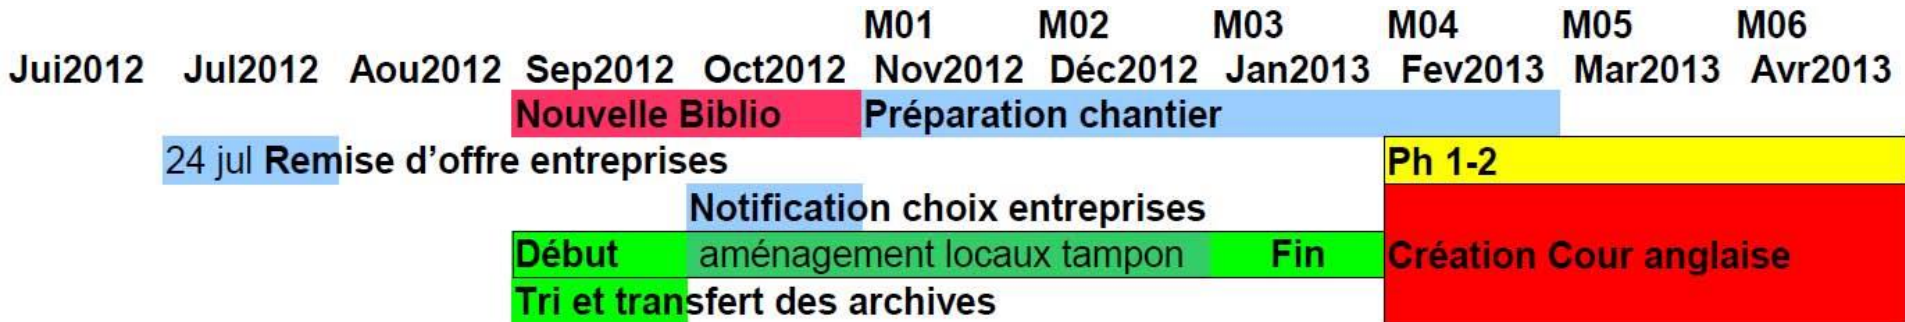


Actions

- 1-Réunions Travaux CPER avec la DGS, le Service Patrimoine, la direction des Dpts. de Chimie, Géosciences ainsi que le CERES-ERTI (entre mi-août et mi-septembre)
- 2-Transfert des archives sur le site de l'ENS de Montrouge (visite des locaux avec l'entreprise de déménageurs le lundi 24 septembre 2012 et déménagement prévu début octobre)
- 3-Aménagement des locaux tampons Bibliothèque

Actions

2-Transfert des archives sur le site de l'ENS de Montrouge

- Demande de devis pour le déménagement des archives à diverses entreprises spécialisées.
- Tri des documents (qui ne seront pas gardés aux archives) a été réalisé principalement début septembre.
- Première opération CPER a pour but de connaître les membres du Dpt. de Physique. Il s'agit de jeter au bac de recyclage papier les documents qui ne seront pas gardés (petit volume). **Elle sera suivie d'un pot au jardin.**





Rendez-vous:

Jeudi 20 septembre 2012 à 16h30 face à la loge.


Travaux CPER

Organisation des archives

Actuelle (Cathédrale)

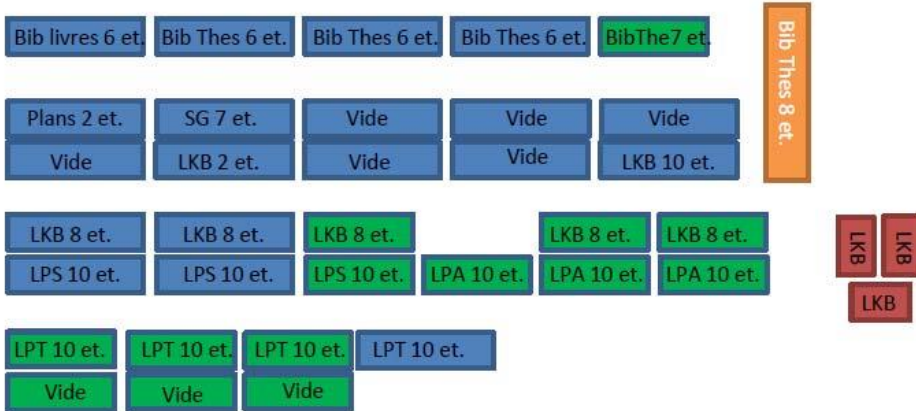

Future (Sous-sol à Montrouge)

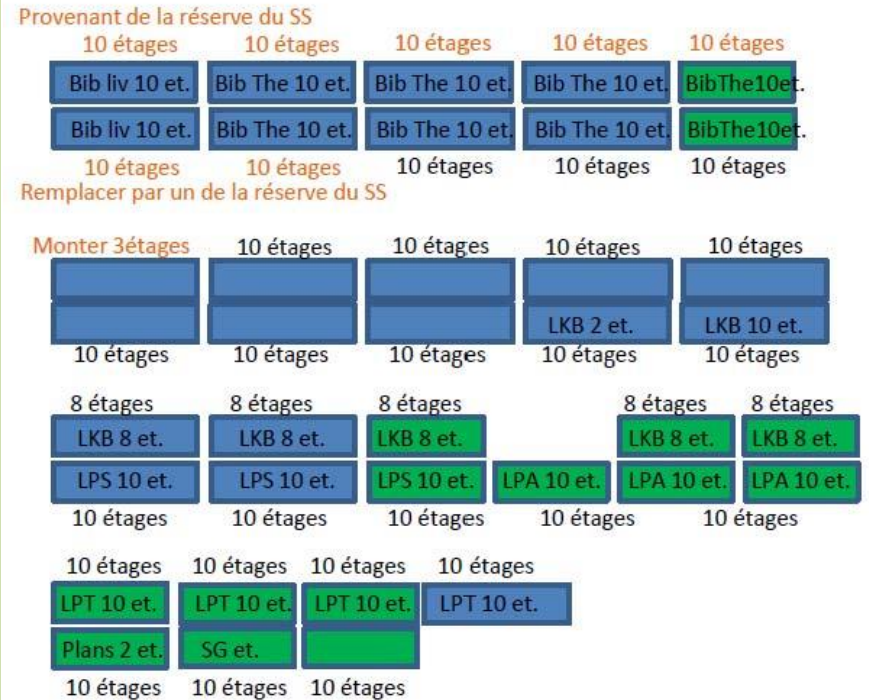


Actions

3-Aménagement des locaux tampon Bibliothèque


- Présentation de plusieurs propositions d'aménagement depuis la réunion du 31 mai 2012.
- Ces propositions sont nées des réunions collectives et individuelles avec les différents Secrétariats et Directions.
- Demande de devis pour l'installation de la climatisation dans le local serveurs à diverses entreprises spécialisées
- Préparation du Projet d'aménagement en collaboration avec le Service Patrimoine. Étant donné que ce projet contient un appel d'offre, **le Service Patrimoine a besoin d'une validation urgente des locaux tampon Bibliothèque.**
- La 4^e et dernière proposition a été mis en place après concertation de l'ensemble des intéressés en tenant compte au maximum de l'organisation de chaque service.

Travaux CPER

4^e proposition des locaux tampons

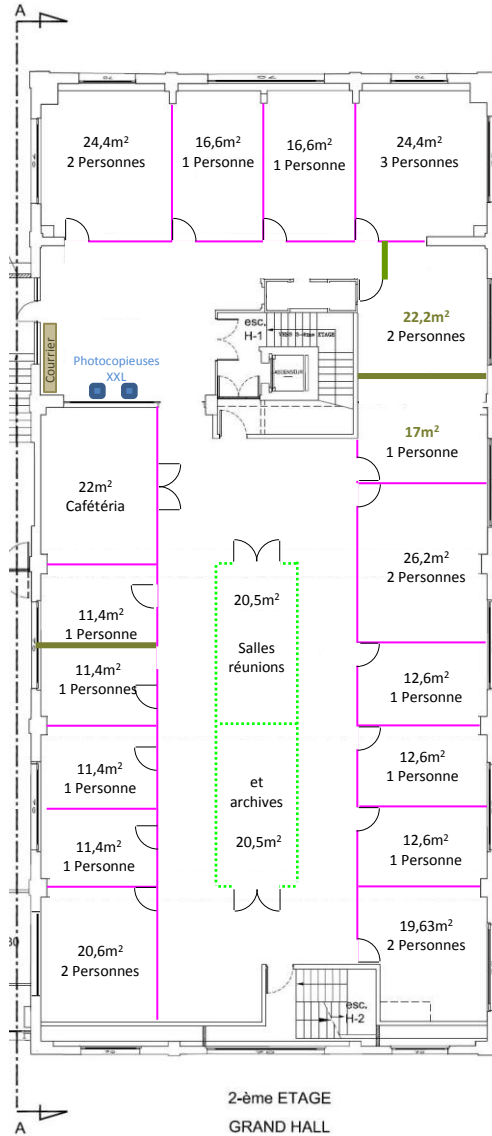


Rue LHOMOND

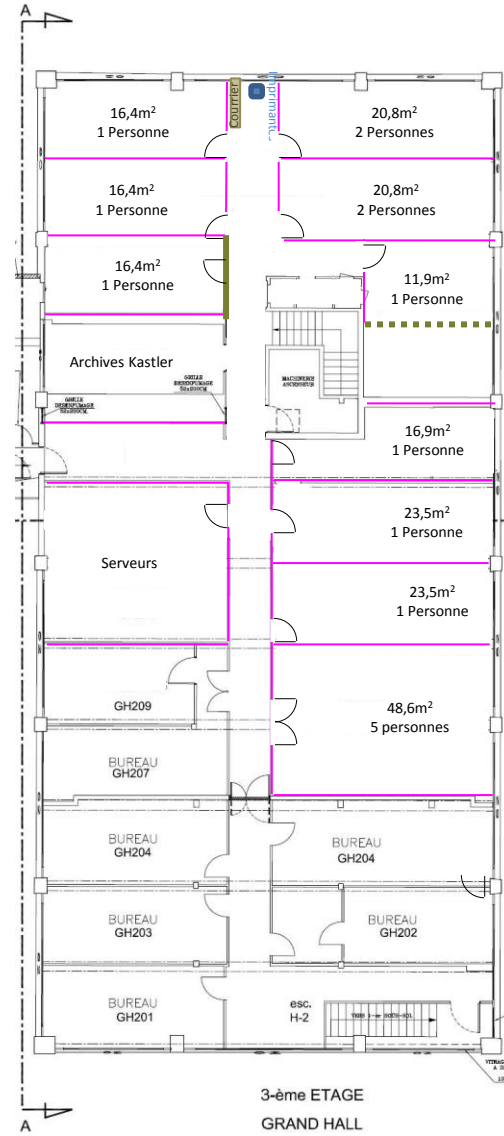


Travaux CPER

4^e proposition des locaux tampons

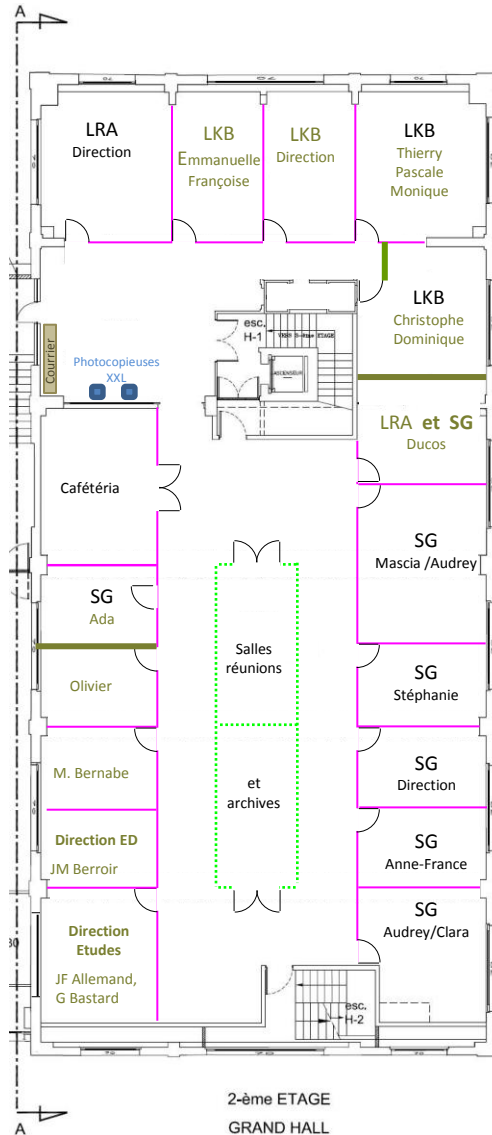

JARDIN

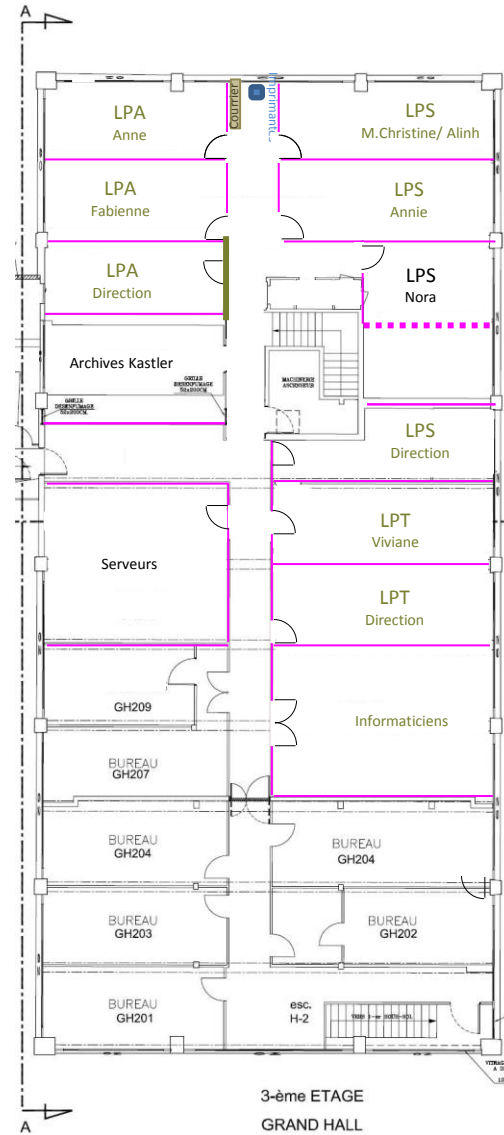

Rue LHOMOND

Futures Actions

- **Mobilier et objets divers**

Divers locaux et espaces (Cathédrale, couloirs, 2e étage bibliothèque, etc...) qui contiennent du mobilier seront impactés par les travaux à partir du mois 4 (février 2013).

A qui sont-ils?, Voulez-vous les donner (Service Logistique), les garder, les jeter?

- **Relogement du personnel**

A-Espace pour reloger:

Nous sommes en concertation avec la DGS et le Rectorat afin d'obtenir des espaces de relogement

Le dpt. De Physique dispose de:

1. Locaux tampons bibliothèque et qui accueilleront les Secrétariats, la Direction et le Service Informatique (40 personnes).
2. Locaux tampons créés par les espaces libérés (bureaux et laboratoires des équipes, les Secrétariats, la Direction ainsi que le Service Informatique) - environ 60 personnes.
3. Bureaux confirmés à Montrouge - environ 40 personnes.
4. Bureaux en négociation à Montrouge - environ 35 personnes.
5. Proposition de locaux tampons au 3^e étage Lhomond si il est livré à la fin du mois 12 (novembre 2013) du planning sur 20 mois - environ 40 personnes.

Futures Actions

B-Personnes à reloger:

1. La création de l'ascenseur et la démolition du 3^e étage impactent environ 20 personnes.

Mois 06 (avril 2013) du planning sur 36 mois ou mois 02 (janvier 2013) du planning sur 20 mois

2. La réhabilitation des circulations impacte:

- Environ 60 personnes par tranches du planning sur 36 mois

Phase 3A- Mois 14 (décembre 2013), Phase 3B- Mois 17 (mars 2014), Phase 3C- Mois 21 (juillet 2014) et Phase 5A- Mois 25 (novembre 2014)

Ou

- Environ 100 personnes

Phase 3A et 5A- Mois 11 (octobre 2013) du planning sur 20 mois

- Environ 35 personnes

Phase 3B- Mois 11 (octobre 2013) du planning sur 20 mois

3. La réhabilitation du Hall et de l'Entresol impacte environ 5 personnes

Mois 27 (janvier 2015) du planning sur 36 mois ou mois 10 (septembre 2013) du planning sur 20 mois

Futures Actions

Pour mettre en place ces actions,
Je devrais vous solliciter, déranger, interpeler, informer
J'aurais donc besoin d'un


- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**
- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**
- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**

J'aurais besoin aussi de vous contacter directement (sans passer à chaque fois par la Direction).

Fin

Merci de votre attention et

N'hésitez pas à solliciter vos collaborateurs (étudiantes en thèse, post-doc, chercheurs, etc...) pour notre premier RDV du jeudi 20 septembre



M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
 Fev2013 Mar2013 Avr2013 mai 2013 Jui2013 Jui2013 Aou2013 Sep2013 Oct2013 Nov2013 Dec2013 Jan2014 Fev2014 Mar2014 Avr2014 mai 2014 Jui2014 Jui2014 Aou2014 Sep2014 Oct2014 Nov2014 Dec2014

Ph 1-2 Cour anglaise, Trémies ascenseur, 3eme

Ph 3 Lhomond

- Ouverture de trémies par chevêtre en béton arme ou par carottage et sciage
- Démolition de plancher par découpage à la scie diamantée
- Démolition des façades sur rue et parc
- Démolition de cloisonnements pour répondre aux besoins des nouvelles distributions
- Pose de poutres de reprise par la dessous des planchers existants (percements, empochements, scellements, etc.)

- Démolition de plancher par découpage à la scie diamantée
- Percement de baies en façades pour prise d'air ventilation désenfumage

M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
 Nov2013 Dec2013 Jan2014 Fev2014 Mar2014 Avr2014 mai 2014 Jui2014 Jui2014 Aou2014 Sep2014 Oct2014 Nov2014 Dec2014 Jan2015 Fev2015 Mar2015 Avr2015 mai 2015 Jui2015 Jui2015 Aou2015 Sep2015 Oct2015 Nov2015 Dec2015 Jan2016

Ph 3 Lhomond

Ph 4.5 Erasme

PH 6 Hall et Entresol

- Démolition du complexe d'étanchéité en toiture (par tous les moyens au choix de l'entreprise)
- Démolition de plancher par découpage à la scie diamantée
- Pose de poutres de reprise par la dessous des planchers existants (percements, empochements, scellements, etc.)

- Démolition de sol carrelé et reprise par chape mince
- Démolition de plancher par découpage à la scie diamantée
- Fouilles en rigoles et en puits (des fondations de l'extension du hall) par engins mécaniques ou à la main


- Ramassage et évacuation des gravois
- Démolition de murs intérieurs et de cloisonnements pour répondre aux besoins des nouvelles distributions. *(Toutes les démolitions des ouvrages en maçonnerie devront être exécutées par **petites parties à la massette et poinçon.**)*
- Coffrage, mise en place d'armatures, coulage de béton,
- Démolition d'escaliers
- Lavage haute pression des parois

2^e proposition des locaux tampons




Travaux CPER

3^e proposition des locaux tampons

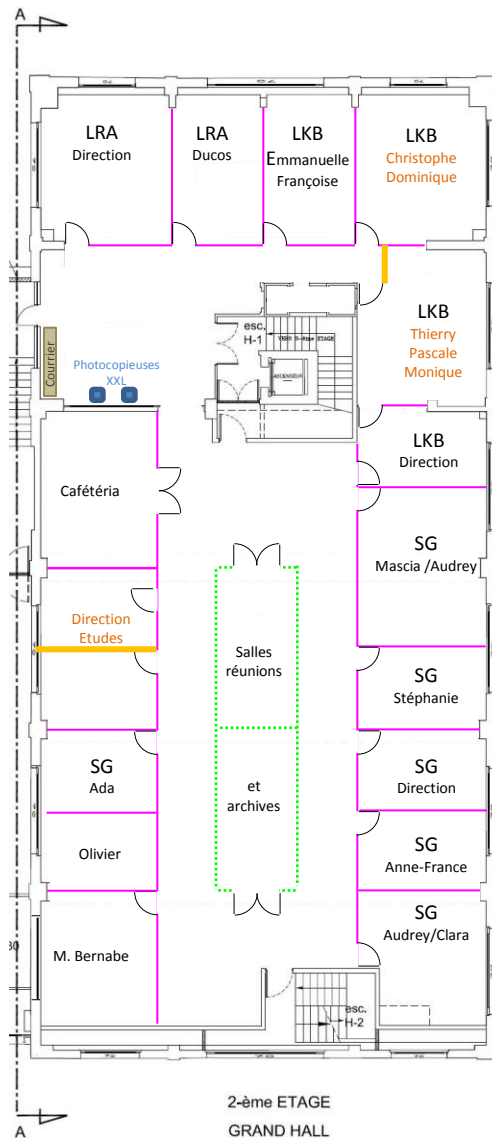

JARDIN

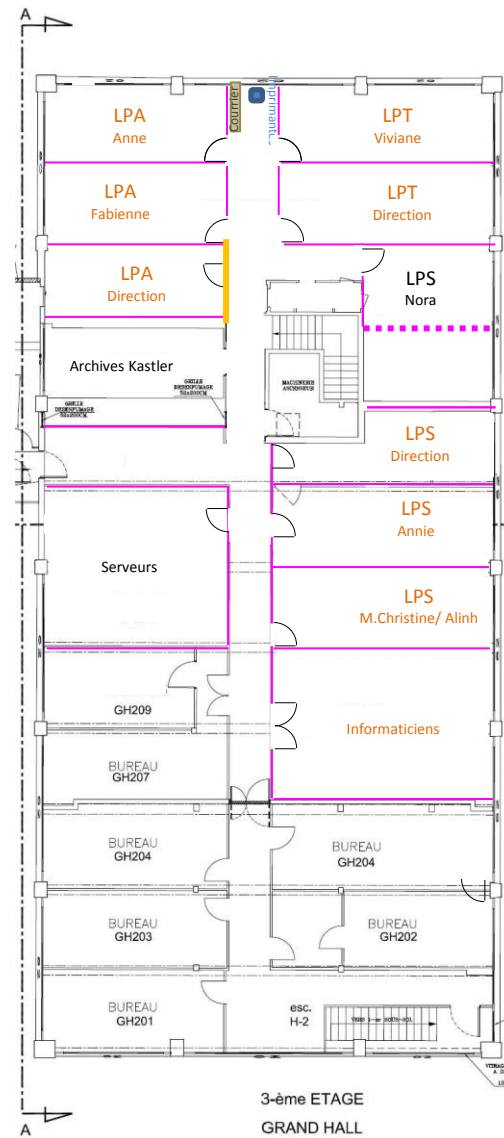

Rue LHOMOND

